


CODICI WBS	VOCI D'OPERA Lavorazioni	lotto	Inc. % manodopera	Costo manodopera	Costo giornaliero manodopera (squadra)	Giornate per 1 squadra	Squadre n.	Durata (gg) lavorat	Durata (gg) solari	inizio	fine
		lotto 1									
001	demolizioni rimozioni	€ 77 046,00	60%	€ 46 227,60	€ 896,00	55	1	55	75	1	75
002	opere strutturali e di consolidamento	€ 3 000,00	40%	€ 1 200,00	€ 896,00	2	1	2	5	115	120
003	massetti sottofondi	€ 30 595,00	30%	€ 9 178,50	€ 896,00	14	1	14	20	160	180
004	murature tramezzi	€ 14 485,00	67%	€ 9 632,53	€ 896,00	14	1	14	18	140	158
005	coperture	€ 78 715,00	50%	€ 39 357,50	€ 896,00	45	1	45	65	75	140
006	isolanti	€ 13 781,43	40%	€ 12 238,00	€ 896,00	14	1	14	18	135	153
007	intonaci	€ 42 693,00	65%	€ 27 750,45	€ 896,00	31	1	31	40	180	220
008	pavimenti e rivestimenti	€ 37 926,00	45%	€ 17 066,70	€ 896,00	23	1	23	40	220	260
009	opere da fabbro/falegname	€ 36 642,00	57%	€ 20 702,73	€ 400,00	55	1	55	75	250	325
010	infissi opere da vetraio	€ 26 402,00	20%	€ 5 280,40	€ 400,00	14	1	14	18	300	318
011	tinteggiature verniciature	€ 52 646,00	80%	€ 42 116,80	€ 600,00	71	2	36	51	310	361
012	assistenze murarie	€ 14 160,00	95%	€ 13 452,00	€ 896,00	16	1	16	22	170	192
013	impianti meccanici	€ 155 116,30	33%	€ 51 188,38	€ 600,00	90	1	90	116	180	296
014	impianti elettrici	€ 129 895,21	20%	€ 26 290,79	€ 600,00	46	1	46	60	220	280
			50%					455 lavorativi	623 solari		360 consecutivi
		lotto 2									
001	demolizioni rimozioni	€ 6 963,49	60%	€ 4 178,09	€ 896,00	5	1	5	7	68	75
002	opere strutturali e di consolidamento	€ 47 937,00	58%	€ 27 726,76	€ 896,00	31	1	31	40	150	190
003	massetti sottofondi	€ 8 261,58	30%	€ 2 478,47	€ 896,00	3	1	3	4	130	134
004	murature tramezzi	€ 2 538,00	67%	€ 1 687,77	€ 896,00	2	1	2	3	120	123
005	coperture	€ -	50%	€ -	€ 896,00	0	1	0	0	0	0
006	isolanti	€ -	40%	€ -	€ 896,00	0	1	0	0	0	0
007	intonaci	€ 3 499,33	65%	€ 2 274,56	€ 896,00	3	1	3	4	125	129
008	pavimenti e rivestimenti	€ 5 872,00	45%	€ 2 642,40	€ 896,00	3	1	3	4	185	189
009	opere da fabbro/falegname	€ 9 363,56	57%	€ 5 290,41	€ 400,00	14	1	14	18	165	183
010	infissi opere da vetraio	€ 4 550,25	20%	€ 910,05	€ 400,00	3	1	3	4	210	214
011	tinteggiature verniciature	€ 6 539,30	80%	€ 5 231,44	€ 600,00	9	1	9	12	225	237
012	assistenze murarie	€ 1 280,96	95%	€ 1 216,91	€ 896,00	2	1	2	3	150	153
013	impianti meccanici	€ 8 480,70	33%	€ 2 798,63	€ 600,00	5	1	5	7	150	157
014	impianti elettrici	€ 24 120,99	20%	€ 4 882,09	€ 600,00	9	1	9	12	138	150
			51%					89 lavorativi	118 solari		237 consecutivi

CODICI WBS	VOCI D'OPERA Lavorazioni
001	demolizioni rimozioni
002	opere strutturali e di consolidamento
003	massetti sottofondi
004	murature tramezzi
005	coperture
006	isolanti
007	intonaci
008	pavimenti e rivestimenti
009	opere da fabbro/falegname
010	infissi opere da vetraio
011	tinteggiature verniciature
012	assistenze murarie
013	impianti meccanici
014	impianti elettrici



001	demolizioni rimozioni
002	opere strutturali e di consolidamento
003	massetti sottofondi
004	murature tramezzi
005	coperture
006	isolanti
007	intonaci
008	pavimenti e rivestimenti
009	opere da fabbro/falegname
010	infissi opere da vetraio
011	tinteggiature verniciature
012	assistenze murarie
013	impianti meccanici
014	impianti elettrici

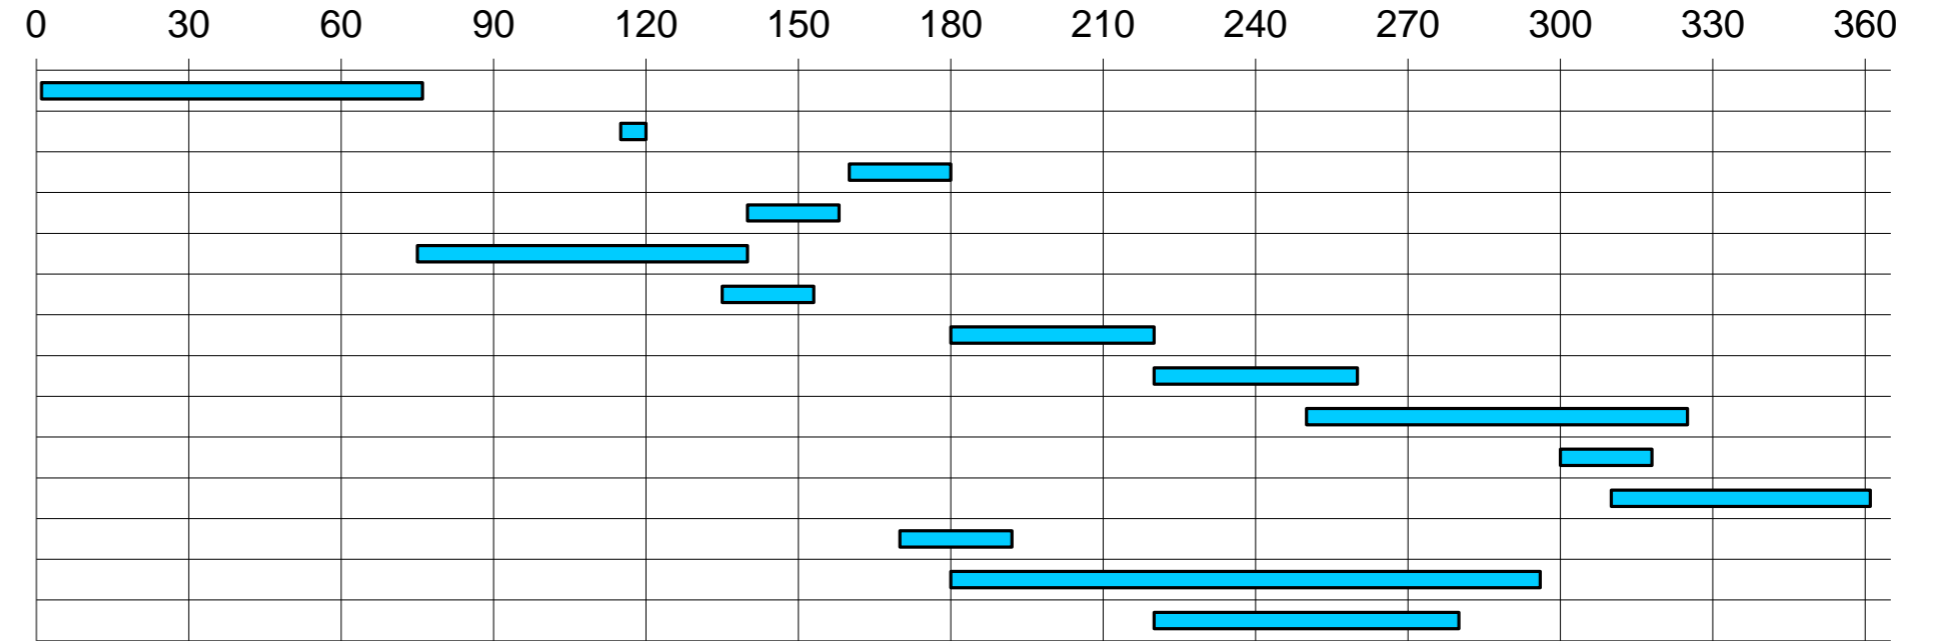
